



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale  
n. 1243 del 19.12.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 439 del 16/12/2016

**Oggetto :** lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del Dlgs n.50/2016 per la sistemazione della condotta idrica in ghisa Ø 60 in via Roma e Ø 80 in via Civiletti n.33. CIG: [Z0C1AFE5CB]. Liquidazione fattura alla ditta VG-Edil Soc. Coop.

**Anno 2016**

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore //////////////// nella sua stanza

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.;

Vista la determinazione sindacale n.68 del 31/10/2016.

Premesso che :

in data 12 agosto 2016, dal geom. Felice Bonardi ha redatto verbale di somma urgenza dal quale si rileva che era stata riscontrata una copiosa fuoriuscita di acqua in via Roma, (adiacente alla tabaccheria Cantavenera) ed era stato constatato che la fuoriuscita d'acqua era dovuta alla rottura della condotta da mm.60 di via Roma e della condotta di via Civiletti.

nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorreva con urgenza procedere alla riparazione della stessa, al fine di ripristinare l'erogazione idrica nei quartieri interessati, ed evitare problemi di natura igienico sanitaria ai residenti nella considerazione che ci troviamo in inoltrata stagione estiva;

Dato atto che:

la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con gli operai comunali, con ordinanza n.120 del 17/8/2016 è stata affidata alla ditta VG Edil Soc. Coop., presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

con determinazione n.314 del 26/8/2016 è stato approvato il computo dei lavori necessari dell'importo presunto di €6.144,74 IVA compresa ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Visto:

il computo a consuntivo dei lavori eseguiti redatto dal tecnico responsabile dell'importo complessivo di €. 5.835,89;

la fattura n.19 del 12/9/2016, trasmessa dalla ditta in data 22 settembre 2016 prot.32372, dell'importo di €. 5.835,88 IVA compresa;

il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

#### DETERMINA

Di liquidare alla ditta VG Edil Soc. Coop. arl la fattura n.19 del 12/9/2016, dell'importo di €. 5.835,88 IVA compresa, relativa ai lavori di *somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la sistemazione della condotta idrica in ghisa Ø 60 in via Roma e Ø 80 in via Civiletti n.33. CIG: [Z0C1AFE5CB]*, con pagamento:

- in quanto a € 4.783,51 alla ditta VG EDIL Soc.Coop. arl,
- in quanto a € 1.052,37 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che la somma di €. 5.835,88 trova copertura al cap.10125 imp.n.79965.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, indicato nella fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C.ff  
Ing. Concetta Di Vincenzo

#### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

*Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana



## COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio idrico

Al Capo Settore UTC  
SEDE

Oggetto: RELAZIONE FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN GHISA DA MM. 60 IN VIA ROMA E MM.80 IN VIA CIVILETTI N°33.

DITTA : GALLEA CARMELINA TITOLARE DELL'IMPRESA V.G. EDIL SOC.COOP. VIALE 1° MAGGIO 23 PALMA DI MONTECHIARO.

Visto il verbale di somma urgenza prot. 28132 del 12/08/2016, avente per oggetto la riparazione della condotta idrica in ghisa da mm.60 in via Roma, adiacente tabaccheria Cantavenera, e mm.100, in via Civiletti n°33.

Vista l'Ordinanza del Capo Settore n° 120 del 17 agosto 2016, con cui si ordinava alla ditta V.G. Edil di Gallea Carmelina, con sede in Viale 1° Maggio 23, Palma di Montechiaro, di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso del 12,00%.

Si rintracciava l'impresa V.G. Edil di Gallea Carmelina, di cui si chiedeva la disponibilità ad iniziare i lavori di riparazione immediatamente, ricevendo risposta positiva si ordinava di iniziare i lavori nella stessa giornata. Recatosi sul luogo, la ditta V.G. Edil di Gallea Carmelina, iniziava a scavare in via Civiletti n.33, riscontrando la rottura della condotta idrica. Si procedeva alla riparazione della condotte e al ripristino delle pavimentazioni con conglomerato bituminoso, in attesa che aprissero gli impianti di conglomerato bituminoso e si metterà in opera lo strato bituminoso finale della pavimentazione. Di seguito si è recato in via Roma e dopo aver scavato si è riscontrato che la diramazione della condotta idrica fino al centro di distribuzione idrica "centro gallo", era completamente ammalorato e di conseguenza si procedeva alla sostituzione della condotta e dell'intero centro gallo. Dopo aver provato la condotta e il centro gallo si è proceduto a riempire lo scavo e l'ultimo strato con del calcestruzzo nelle more che aprano gli impianti del conglomerato bituminoso e si procederà al completamento con uno strato di usura.

Nessun incidente a persone o cose è successa durante i lavori.

La descrizione analitica e la contabilità finale è riportata in foglio excel allegato.

Palma di Montechiaro li

Il Coordinatore dell'Ufficio Idrico

Geom. Bngio Lo Presti



	Provincia di Agrigento				
	Ufficio Idrico				
			<b>AL DIRIGENTE U.T.C.</b>		
			<b>SEDE</b>		
	<b>CONSUNTIVO DEI LAVORI</b>				
	<b>VIA CIVILETTI N°33</b>				
			metri3/mq/ml/ore	costo unitario Euro	totale euro
	Rilevazione costo della manodopera edile calcolato ai sensi del D.C.P.S. n.763,della Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.1548 del 22,10,1947, e n. 6053 del 15,10,1952, e della Legge 10,12,81,n.741 art.14 Costo valevole da 01/07/2015.				
1	Operaio comune 1° livello per assistenza a demolizione solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio chiusini in ghisa e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte.Per ogni ora euro 28,21.	ore	12,00	23,95	287,40
2	Operaio qualificato 2° livello per montaggio solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio chiusini in ghisa e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 31,32.	ore	12,00	26,59	319,08
3	Nolo escavatore da 40 a 120 ql. Dato sul posto di lavoro compreso operatore, carburanti lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo in perfette condizioni. Per ogni ora euro 50,00.	ore	7,00	50,00	350,00
4	Trasporto a pubbliche discariche nel comune in cui si eseguono i lavori . Codice 21.1.26. Del prezzario regionale vigente: Per ogni metro cubo di materiale misurato sul mezzo .... euro. 26,64				
	Scavo via Civiletti 8,50*1,40*1,50=mc.	mc.	17,85	26,64	475,52
5	6.1.1.1. Fornitura e posa in opera di Tout-venant di cava , secondo le caratteristiche del prezzario regionale vigente per ogni mc. Euro 30,50. scavo via civiletti 8,00*1,50*1,00= mc.	mc.	12,00	30,50	366,00
6	31.1.7. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondo pavimentazione e ancoraggio condotta idrica, per ogni mc. Euro 133,00.	mc.	1,50	133,00	199,50
7	6.1.5.2. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso – tappetino di usura per qmq/cm. Euro 2,70. scavo via cellini 8,00*1,50*5=	mq.	60,00	2,07	124,20
8	Codice 23.1.3.1.Del prezzario regionale vigente: Fornitura e posa in opera di schermo di protezione ... per ogni mq. Euro 10,10. scavo ml.8,00+8,00+1,50+1,50= 19,00	mq.	19,00	10,10	191,90
				<b>somma euro</b>	<b>2313,604</b>
	<b>VIA ROMA adiacente tabaccheria</b>				








FOTO INTERVENTO  
RIPARAZIONE IDRICA VIA  
ROMA E VIA CIVILETTI



Via Roma n° 142 Attacco centro  
gallo sostituito

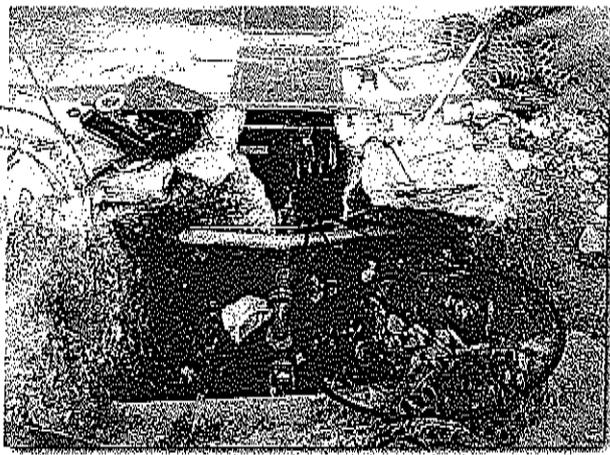

via Roma n° 142 detrito per  
riempimento

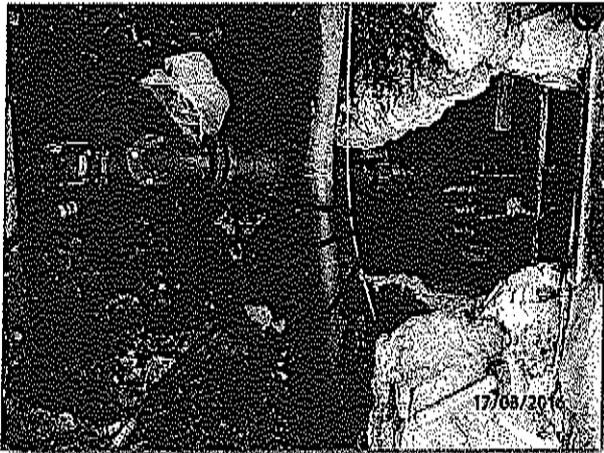

Via Roma n° 142 Particolare  
attacco centro gallo.



Via Civiletti n°33 ripristino con cls.

Palma di Montechiaro  
li 26/08/2016



Il Tecnico UTC  
Geom. Biagio Lo Presti

Prot 32372 del 22/9/2016

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

## Trasmissione nr. ALB702405

Da: IT04030410288 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 049 9426171

E-mail: [fattura@2csolution.it](mailto:fattura@2csolution.it)

Mittente: VG EDIL SOCIETA' COOPERATIVA  
 Partita IVA: IT02569380849  
 Codice fiscale: 02569380849  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA PRIMO MAGGIO,23 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
 Numero di iscrizione: 191485  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 E-mail: [impresavg2013@gmail.com](mailto:impresavg2013@gmail.com)

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -  
 4 Settore - Ufficio Tecnico Comunale  
 Codice Fiscale: 81000070847  
 Sede: VIA FIORENTINO,89 - 92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

## FATTURA NR. 19/2016 DEL 12/09/2016

Importo totale documento:

5.835,88 (EUR)

Importo da pagare :

4.783,51 (EUR)

Causale: VS DARE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN GHISA DA MM. 60 IN VIA ROMA E MM. 80 IN VIA CIVILETTI, 33 RIBASSO 12% PIÙ ONERI PER LA SICUREZZA.

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/magglorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VS DARE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE E DELLA CONDOTTA IDRICA IN GHISA DA MM. 60 IN VIA ROMA E MM. 80 IN VIA CIVILETTI, 33 RIBASSO 12% PIÙ ONERI PER LA SICUREZZA.	1.00	NM	4981,260000	Sconto 12,00% Importo: 597,75	4.383,51	22,00%
2	ONERI PER LA SICUREZZA			400,000000		400,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Fatture collegate	19/2016	12/09/2016	Z0C1AFE5CB

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	0,00	4.783,51	1.052,37	Scissione dei pagamenti	IVA A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI ART. 17TER DEL DPR N.633/72

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	4.783,51	IT29M0577283030CC0080080372

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4761370	Data richiesta	31/10/2016	Scadenza validità	28/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VG EDIL SOC. COOP. A.R.L.
Codice fiscale	02569380849
Sede legale	VIA 1 MAGGIO,23 PALMA DI MONTECHIARO AG 92020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE





**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**Provincia di Agrigento**  
**IV settore - Ufficio Tecnico**

Prot. n. \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Oggetto: Catanzaro costruzioni - sollecito adempimenti contrattuali – nota prot. n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ 2016

Catanzaro Costruzioni srl  
Via Miniera Ciavolotta Lotti 92-94  
92026 Favara  
PEC: [catanzarocostruzioni@pec.it](mailto:catanzarocostruzioni@pec.it)

Responsabile Servizi Finanziari  
SEDE

In relazione al sollecito di cui alla nota indicata all'oggetto si rappresenta, distintamente per ognuna delle fatture menzionate, che come più volte evidenziato, la quota relativa al ribaltamento dei costi è assoggettata all'IVA al 22% anziché al 10% in quanto riferiti a smaltimento di rifiuti provenienti dalla selezione dei rifiuti.

Più volte si è chiesto a codesta ditta di regolarizzare le fatture o, in alternativa, di manifestare la volontà di emettere future note di credito per la differenza derivante dalla esatta applicazione dell'aliquota.

Ritenuto, comunque, doveroso saldare il debito contrattuale, in tal senso si danno assicurazioni, con l'intesa che, risolto il problema con l'Agenzia delle Entrate, alla quale, come da vostra comunicazione, è stato posto specifico quesito, saranno rimessi in favore di questo ente gli importi relativi. Su tale soluzione è gradita nota di conferma.

Le fatture interessate dal problema evidenziato sono quelle elencate nel quadro sinottico allegato.

Si rappresenta, infine, che la Vs. fattura n. 1037 del 01/07/2016, dell'importo complessivo di €. 14.623,72, è stata posta in liquidazione con determinazione del Capo settore U.T.C. n. 320 del 29/8/2016, ed è in corso il relativo pagamento.

Il Capo Settore U.T.C.  
Ing. Concetta Di Vincenzo

<b>SINTESI DISCARICA ANNO 2015</b>		
RIBALTAMENTO E PENALITA' GENNAIO	135/3.4.15	€ 1.431,06
RIBALTAMENTO E PENALITA' APRILE	365/06.5.15	€ 4.270,88
RIBALTAMENTO E PENALITA' MAGGIO	553/4.6.15	€ 3.519,64
RIBALTAMENTO E PENALITA' LUGLIO	1006/4.8.15	€ 2.837,94
RIBALTAMENTO E PENALITA' AGOSTO	1200/2.9.15	€ 2.137,90
RIBALTAMENTO E PENALITA' SETTEMBRE	1374/5.10.15	€ 2.790,36
RIBALTAMENTO E PENALITA' OTTOBRE	1624/9.11.15	€ 3.088,49
RIBALTAMENTO E PENALITA' NOVEMBRE	1857/3.12.15	€ 2.459,82
RIBALTAMENTO E PENALITA' DICEMBRE	2087/31.12.15	€ 1.890,89
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 24.426,98</b>
<b>SINTESI DISCARICA ANNO 2016</b>		
RIBALTAMENTO E PENALITA' GENNAIO	127/26.1.16	€ 314,03
RIBALTAMENTO E PENALITA' GENNAIO	274/2.2.16	€ 117,69
RIBALTAMENTO E PENALITA' FEBBRAIO	442/2.3.16	€ 670,76
RIBALTAMENTO E PENALITA' MARZO	623/2.4.16	€ 916,51
RIBALTAMENTO E PENALITA' APRILE	814/3.5.16	€ 337,82
RIBALTAMENTO E PENALITA' MAGGIO	995/3.6.16	€ 568,32
RIBALTAMENTO E PENALITA' GIUGNO	1138/2.7.16	€ 234,77
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.159,90</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 27.586,88</b>

Ing. Concetta Di Vincenzo
