



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 505 del 12.05.2017

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 124 del 8/5/2017

Oggetto: lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 per la riparazione della condotta idrica da mm.300, nel tratto di condotta della Tre Sorgenti proveniente dal partitore Sconfitta, in c/da Cipolla. CIG: [Z981E0C026]. Liquidazione fattura alla ditta GIU.CA.MAN. srls.

Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C.n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n.18/2017 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione PEG provvisorio;

Vista la determinazione commissariale n.8 del 31/3/2017.

Premesso che:

in data 18 marzo 2017 il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza dal quale si rilevava che su segnalazione di alcuni proprietari di terreni in c/da Cipolla, effettuato sopralluogo era stata constatata una copiosa fuoriuscita di acqua dall'interno di un pozzetto in calcestruzzo dove è collocata la condotta da mm 300, tuttavia non era stato individuato il punto di rottura proprio perché l'acqua impediva la visuale;

nell'immediato si è proceduto a contattare il Consorzio Tre Sorgenti che ha interrotto la fornitura, per evitare la perdita di acqua, danni alle colture circostanti e permettere di individuare il guasto;

individuata la rottura della condotta all'interno del pozzetto, la riparazione è apparsa molto difficoltosa in quanto mancava lo spazio per potere operare, pertanto, si rendeva necessaria la demolizione di parte del pozzetto in cemento armato per procedere poi alla riparazione della condotta, realizzata artigianalmente, a mezzo di un fabbro;

Dato atto che:

i lavori di ripristino della funzionalità della condotta, scavo a ridosso della condotta, riparazione del danno e ripristino dello stato dei luoghi, rivestivano carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 18.04.2016 n.50;

la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con ordinanza n.36 del 20/3/2017 è stata affidata alla ditta Giu.ca.man srls, presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

con determinazione n.96 del 30/3/2017 è stato approvato il computo dei lavori di che trattasi e assunto il relativo impegno di spesa;

Atteso che:

i lavori sono stati regolarmente eseguiti, giusta relazione a consuntivo redatta dal tecnico responsabile;

in data 2 maggio 2017 prot.14683, la ditta ha trasmesso la fattura n.1 del 28/4/2017, dell'importo di €.2.473,07 IVA compresa;

la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta GIU.CA.MAN. srls la fattura n.1 del 28/4/2017 dell'importo di €.2.473,07 IVA compresa, relativa ai lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 per la riparazione della condotta idrica da mm.300, nel tratto di condotta della Tre Sorgenti proveniente dal partitore Sconfitta, in c/da Cipolla. CIG: [Z981E0C026], con pagamento:

- in quanto a € 2.027,11 alla ditta Giu.Ca.man srls,
- in quanto a € 445,96 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che la somma di €.2.473,07 trova copertura all'intervento 01052.02.0125 imp.n°81154;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, indicato nella fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 3° del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore V.T.C.
ing. Confetta Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Prot. 14683 del 2/5/2017

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00WxE verso PA

Da: IT01021160328 a: JQUS1V

Formato: FPA12

Telefono: 0409751179

E-mail: info@fatturaelettronica.pa.it

Mittente: GIU.CA.MAN. srls
 Partita IVA: IT02819850849
 Codice fiscale: 02819850849
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via duccio galimberti 2 - 92020 - Palma di Montechiaro (AG) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
 Numero di iscrizione: 02819850849
 Capitale sociale: 0.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 3899871080
 E-mail: giuseppemanazza76@gmail.com

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro
 Codice Fiscale: 81000070847
 Sede: Via Fiorentino 89 - 92020 - Palma di Montechiaro (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328

Com. di Palma di Montechiaro 26/4/17

FATTURA NR. 1/PA DEL 28/04/2017

Importo totale documento:

2.473,07 (EUR)

Importo da pagare :

2.027,11 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Lavori somma urgenza per la riparazione della condotta da 300 nel tratto di condotta idrica della tre sorgenti proveniente dal portatore di C/da Ssconfitta nella zona di c/da Cipolla ordinanza n 36	1.00	2027,110000	2.027,11	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	000000	Z981E0C026

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	2.027,11	445,96	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	2.027,11	IT02D010051660000000007066

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6463050	Data richiesta	20/02/2017	Scadenza validità	20/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIU.CA.MAN. S.R.L.S
Codice fiscale	02819850849
Sede legale	VIA DUCCIO GALIMBERTI, 2 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio idrico

**Al Capo Settore UTC
SEDE**

Oggetto: RELAZIONE FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DELLA 3 SORGENTI, CHE DAL PARTITORE DI CANICATTI' VA AL SERBATOIO CARRUBBITO, NEL TRATTO DI CONTRADA CIPOLLA.
ORDINANZA N.36 DEL 20 MARZO 2017.
DITTA GIUCAMAN di Manazza Giuseppe, Via D. Galimberti n.2, PALMA DI MONTECHIARO.

Visto il verbale di somma urgenza del 18/03/2017, avente per oggetto la riparazione della condotta idrica della 3 Sorgenti sita in contrada "Cipolla" che rifornisce il nostro partitore di contrada "Sconfitta";

Vista l'Ordinanza del Capo Settore n° 36 del 20 marzo 2017, con cui si ordinava alla ditta Giucaman di MANAZZA Giuseppe, con sede in Palma di Montechiaro in via D. Galimberti n.2, di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso del 9,00%;

Rintracciata l'impresa Giucaman, si chiedeva la disponibilità ad iniziare i lavori di riparazione immediatamente, ricevendo risposta positiva si davano disposizioni ad iniziare i lavori nella stessa giornata. Recatosi sul luogo, la ditta Giucaman, iniziava a demolire la spalletta del pozzetto in calcestruzzo in modo da poter essere possibile la saldatura della condotta.

In seguito, interrotto il flusso all'interno della condotta, si è proceduto alla saldatura della parte "ammalorata" e successivamente si è proceduto ad immettere l'acqua in condotta per verificare l'integrità della saldatura. Considerato che nelle 24 ore successive non ci sono state perdite e che la stessa quantità d'acqua messa in condotta arrivava al serbatoio di Palma di Montechiaro di contrada Carrubbito.

Si allega foglio excel con l'importo da liquidare pari ad euro 2.473,07, con l'elenco del materiale e le quantità impiegate.

Palma di Montechiaro li



Il Coordinatore dell'Ufficio Idrico
Geom. Biagio Lo Presti



Provincia di Agrigento

Ufficio Idrico

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

AL DIRIGENTE U.T.C.

SEDE

CONSUNTIVO DEI LAVORI

Condotta 3 Sorgenti c/da Cipolla

metri3/mq/ml/ore

costo unitario Euro

totale euro

Rilevazione costo della manodopera edile calcolato ai sensi del D.C.P.S. n.763, della Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.1548 del 22,10,1947, e n. 6053 del 15,10,1952, e della Legge 10,12,81,n.741 art.14 Costo valevole da 01/07/2015.

1 Operaio comune 1° livello per assistenza a demolizione solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 28,21.

ore

16,00

28,21

451,36

2 Operaio qualificato 2° livello per saldatura del tubo in acciaio per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 31,32.

ore

8,00

31,32

250,56

3 Nolo gruppo elettrogeno, saldatrice e quanto altro necessario per dare il servizio a perfetta regola d'arte. EURO/ORA 8,00.

ore

8,00

12,00

96,00

3 Nolo escavatore da 40 a 120 ql. Dato sul posto di lavoro compreso operatore, carburanti lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo in perfette condizioni. Per ogni ora euro 50,00.

ore

16,00

50,00

800,00

4 Rifacimento della spalletta prima demolita, per permettere la saldatura in conci di tufo dello spessore di cm. 25. Compreso materiale e mano d'opera.

a corpo

300,00

sommano euro 1897,92

totale lavori euro 1897,92

Ribasso 9% pari a euro 170,81

restano euro 1727,11

oneri sicurezza euro 300,00


sommano euro 2027,11

IVA 22% pari a euro 445,96


TOTALE EURO 2473,07

Il Tecnico U.T.C.

Geom. Biagio Lo Presti

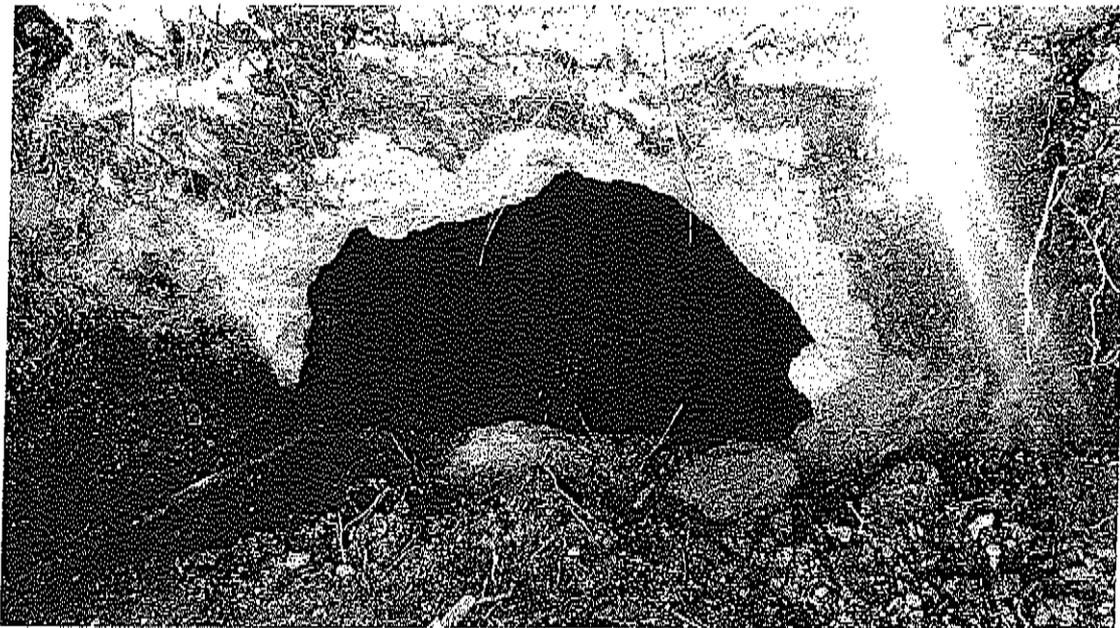


**Foto 1
lavori
preparatori
alla
saldatura**

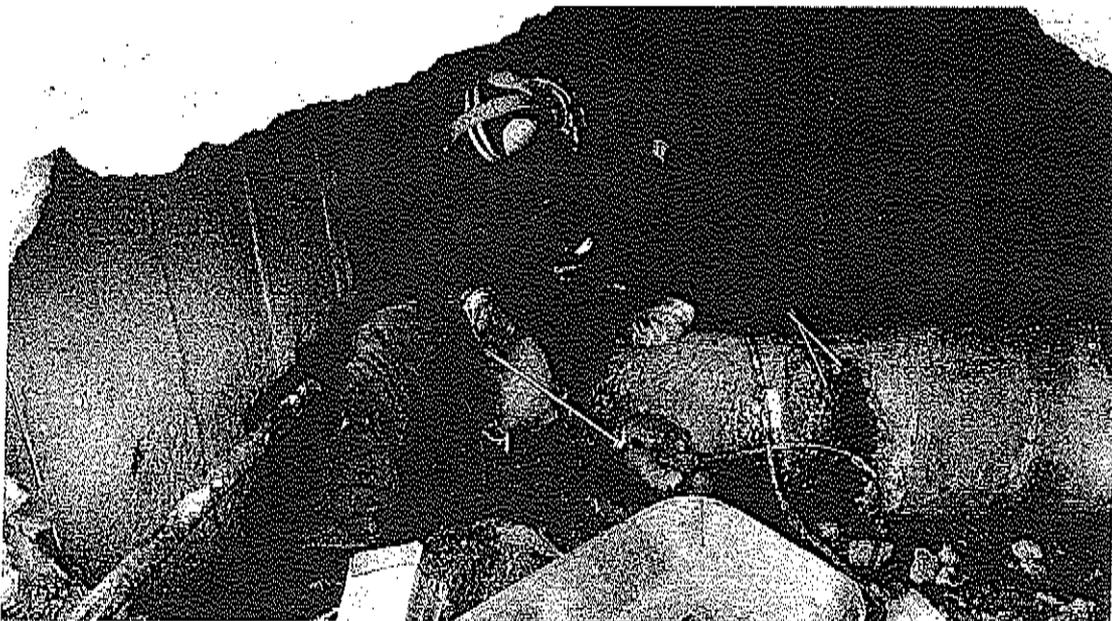

**Foto 2
lavori di
saldatura**



**Foto 3
saldatura
completa**



**Il Tecnico Ufficio Idrico
Geom. Biagio Lo Presti**

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE _____
