



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 882 del 17-07-2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°248 del 10 luglio

Oggetto lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la sistemazione della condotta idrica Ø 200 in ghisa sita in via Pirandello incrocio via Italia e via Turati incrocio salita Collegio. CIG: [ZF0140A2DC]. Liquidazione fattura alla ditta Bellia Giuseppe.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di luglio alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione Consiliare n.76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione PEG provvisorio;

Vista la determinazione sindacale n.1 del 27/1/2015.

Visto l'art.3 della L.n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'A.V.C.P.

Premesso che :

su segnalazione del locale comando di Polizia municipale, in merito ad una copiosa fuoriuscita di acqua in via Pirandello-incrocio via Italia, di fronte alla scuola media Tomasi, è stato effettuato sopralluogo dal quale è emersa la rottura della condotta principale che alimenta le scuole, gli uffici e la zona est dell'abitato;

nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorre con urgenza procedere allo scavo per mettere in luce la condotta e provvedere a riparare la stessa;

situazione simile si è creata in via Turati a seguito della rottura dell'anello in ghisa dove la fuoriuscita e infiltrazione di acqua ha dato luogo allo sprofondamento della sede stradale con grave pericolo per il transito pedonale e veicolare;

in data 31/3/2015 il Geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza dal quale si evince la necessità urgente di riparare agli inconvenienti suddetti al fine di evitare disagi alla cittadinanza;

accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, con Ordinanza n.41 del 31 marzo 2015 è stata disposta la immediata esecuzione dei lavori necessari per la sistemazione della condotta idrica in argomento affidando gli stessi alla ditta Bellia Giuseppe, di Palma di Montechiaro;

Dato atto che con determinazione n.134 del 9/4/2015 è stato approvato il computo dei lavori necessari dell'importo presunto di €.12.400,00 IVA compresa ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Visto:

- il computo dei lavori eseguiti per un importo di €.9.450,37 redatto dal tecnico responsabile ;
- la fattura n.1 del 25/6/2015, trasmessa dalla ditta in data 25 giugno 2015 prot.20436 dell'importo di €.9.450,38 IVA compresa;
- il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Bellia Giuseppe la fattura n.1 del 25/6/2015 dell'importo di €.9.450,38 IVA compresa, relativa ai lavori di *somma urgenza ai sensi dell'art.176 del D.P.R. n.207/2010 per la sistemazione della condotta idrica Ø 200 in ghisa sita in via Pirandello incrocio via Italia e via turati incrocio salita Collegio. CIG: [ZF0140A2DC].*, con pagamento:

- in quanto a €.7.746,21 alla ditta Bellia Giuseppe,
- in quanto a €.1.704,17 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del d.P.R. n.633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che la somma di €.9.450,38 trova copertura al cap.10516 imp.n.76219 sub 76933.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, indicato nella fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000 .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ufficio Idrico

**AL CAPO SETTORE U.T.C.
SEDE**

Oggetto: RELAZIONE FINALE LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DA MM.200 SULLA VIA PIRANDELLO INCROCIO ITALIA E IN VIA TURATI INCROCIO SALITA COLLEGIO.

DITTA BELLIA GIUSEPPE VIA CORSO ODIERNA, PALMA DI MONTECHIARO

Con Ordinanza del Capo settore UTC n° 41 del 31.03.2015 venivano assegnati alla Ditta Bellia Giuseppe con sede in Corso Odierna, Palma di Montechiaro, i lavori per la sistemazione della condotta idrica mm. 200 in Corso Odierna incrocio via Italia e in via Turati incrocio Salita Collegio. Immediatamente la ditta iniziava i lavori in oggetto con lo scavo a ridosso del pozzetto dove è fuoriuscita l'acqua, per effettuare la riparazione del tubo in ghisa rotto è stata necessaria demolire la soletta del pozzetto e dell'area circostante. Si è proceduto ad effettuare la riparazione della condotta e ricostruire la soletta del pozzetto in cemento armato. In via Turati si è proceduto allo scavo fino al raggiungimento della condotta in ghisa da mm.200, mettendo a nudo la prima rottura in direzione della via Salita Collegio, che si riparava nell'immediato e si procedeva alla ricerca dell'altra rottura che si trovava a circa 20 metri in direzione Est, procedendo anche per essa alla riparazione a mezzo di due manicotti e tratto di tubo. Provate le due condotte si procedeva al riempimento degli scavi con del materiale arido, trasportando il materiale di risulta a discarica autorizzata e alla fine si è proceduto alla posa in opera di conglomerato bituminoso previo sottofondo di strato in calcestruzzo. Durante il corso dei lavori non è successo nessun incidente o altro che possa essere pregiudizievole per l'Amministrazione comunale, anche se il tratto interessato allo scavo di via Turati la carreggiata stradale è stretta e ha reso il lavoro difficile, difficoltoso ed oneroso per la presenza di operai addetti al traffico per non deviare il traffico dei autobus creando disagio ai cittadini.

I lavori sono iniziati giorno 01/04/2015, e completati 10/04/2015, l'incidenza della mano d'opera è stata del 10,00 % .

La descrizione analitica e la contabilità finale si rileva in foglio EXEL allegato.

Si allegano foto delle fasi dell'intervento effettuato.

Palma di Montechiaro



Il Tecnico Ufficio Idrico
Geom. Bragio Lo Presti

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO			
PROVINCIA DI AGRIGENTO			
UFFICIO IDRICO			
AL DIRIGENTE UTC			
SEDE			
CONSUNTIVO LAVORI manutenzione rete idrica da mm.200, in ghisa posta in			
via Pirandello incrocio via Italia e in via Turati incrocio Salita Collegio.			
Ditta Bellia GIUSEPPE via Corso Odierna Palma di Montechiaro			
VERBALE SOMMA URGENZA DEL 31 marzo 2015			
Ordinanza Dirigenziale n° 41 del 31/03/2015			
Intervento su via Pirandello incrocio via Italia			
Descrizione lavori	costo unitario	quantità	sommano euro
1 nolo a caldo escavatore			
per ogni ora euro	78,89	10,00	788,90
2 nolo a caldo autocarro			
per ogni ora euro	50,00	8,00	400,00
3 manicotti n°2 mm.150 pari a Kg. 29,30			
Kg.29,30+29,30 = kg. 58,60	10,60	58,60	621,16
4 Fornitura e posa in opera di tubo in ghisa			
per acquedotto ...da mm.150 per ogni ml.			
ml.3	50,00	3,00	150,00
5 Conglomerato cementizio per ripristino			
soletta, spalette e pavimentazione..			
per ogni mc. Euro	124,00	4,00	496,00
6 Acciaio in barre ad aderenza migliorata			
per soletta pozzetto e spallette...			
per ogni Kg.= euro	1,64	90,00	147,60
7 Casseforme per armatura soletta pozzetto			
per ogni mq.	19,70	11,39	224,38
8 Conferimento materiale di scavo			
	0,63	40,81	25,71
5 Tout-venant per ricoprimento scavo			
per ogni mc. Euro	30,50	9,36	285,48
6 C/s bituminoso per pavimentazione stradale			
strato di usura			
ml.2,60x2,00 x 10	52,00	2,07	107,64
		sommano euro	3246,87
1 Recinzione codice 23,1,3,1, di rete in			
Polietilene per mq. Euro 10,10	20	10,10	202,00
2 Elmetto per uno euro 5,70	2	5,70	11,40
3 Occhiali per paio euro 15,90	1	15,90	15,90
4 Guanti per paio euro 2,30	2	2,30	4,60
5 maschera per una euro 2,10	2	2,30	4,60
	oneri sicurezza	sommano euro 238,50	238,50
	Sommano i lavori	senza oneri sicurezza	3246,87
	Ribasso -12%	euro	389,62
	sommano	euro	2857,25
	oneri sicurezza	euro	238,5
	Sommano i lavori	euro	3095,75
	+ IVA 22%	euro	681,06
		TOTALE euro	3776,81
IL TECNICO UTC			
Geom. Biagio Lo Presti			

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO			
PROVINCIA DI AGRIGENTO			
UFFICIO IDRICO			
			AL DIRIGENTE UTC
			SEDE
CONSUNTIVO LAVORI manutenzione rete idrica da mm.200, in ghisa posta in			
via Turati incrocio salita Collegio.			
Ditta Bellia GIUSEPPE via Corso Odierna Palma di Montechiaro			
VERBALE SOMMA URGENZA DEL 31 marzo 2015			
Ordinanza Dirigenziale n° 41 del 31/03/2015			
Intervento su via Turati incrocio via Salita Collegio			
Descrizione lavori	costo unitario	quantità	sommano euro
1 nolo a caldo escavatore			
per ogni ora euro	78,89	16,00	1262,24
2 Operaio comune per assistenza ai lavori			
di manutenzione per ogni ora euro 30,00			
n° due operai per giorni 2 per ore 8 = ore	30,00	32,00	960,00
3 nolo a caldo autocarro compreso operatore.....			
per ogni ora euro	50,00	8,00	400,00
4 manicotti in ghisa n°2 mm.200 pari a Kg. 35,00			
Kg.35,00+35,00 = kg. 70,00	10,80	70,00	756,00
5 Fornitura e posa in opera di tubo in ghisa			
per acquedotto ...da mm.200 per ogni ml.			
ml.3,00,	85,00	3,00	255,00
6 Conglomerato cementizio per ripristino			
pavimentazione..			
per ogni mc. Euro	124,00	5,15	638,60
7 Tout-venant per ricoprimento scavo			
per ogni mc. Euro	30,50	9,36	285,48
8 Conferimento materiale di scavo			
	0,63	40,81	25,71
9 CIs bituminoso per pavimentazione stradale			
strato di usura			
ml.(2,60x2,00 x 10) x 2	208,00	2,07	430,56
		sommano euro	5013,59
	Sommano i lavori	euro	5013,59
	Ribasso -12%	euro	601,63
	restano euro	euro	4411,96
	oneri sicurezza	euro	238,50
	totale	euro	4650,46
	+ IVA 22%	euro	1023,10
		TOTALE euro	5673,56
RIEPILOGO			
	imponibile	IVA 22%	Totali
via pirandello	3095,75	681,06	3776,81
via turati	4650,46	1023,10	5673,56
sommano	7746,21	1704,17	9450,37



IL TECNICO UTC
Geom. Biagio Lo Presti

Intervento su via Pirandello


Fuoriuscita dell'acqua



Scavo sulla condotta e demolizione della soletta in c.a.



Sostituzione tratto di condotta

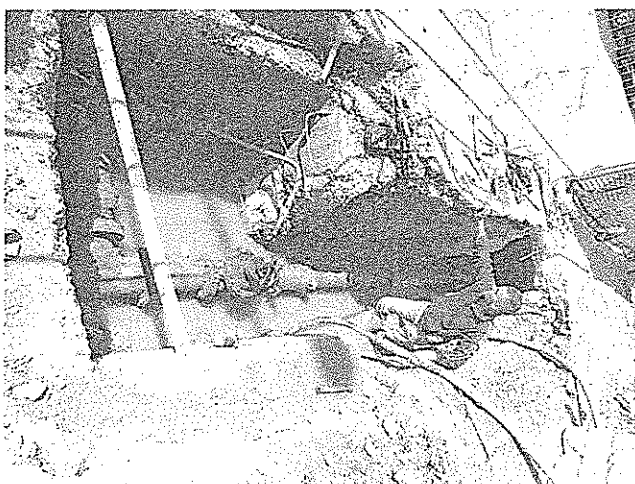

Ripristino pavimantazione



Bitumatura pavimentazione



Bitumatura completa



Via Turati - Salita Collegio

Scavo sulla condotta




Messa a nudo della condotta




Sostituzione tubo rotto



Ripristino condotta con CLS

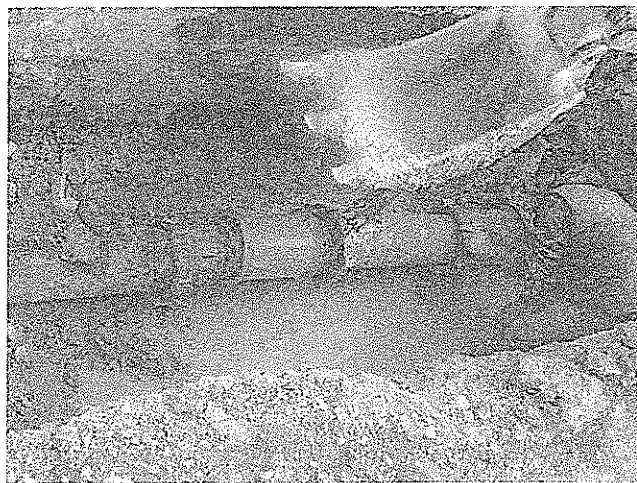

Taglio bitume per completamento



Il Tecnico
Geom. B. Lo Presti

Prot. 20436 del 25/6/2015

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 0000281909**

Da: IT01879020517 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Telefono: 3905750505

E-mail: info@arubapec.it

Mittente: Impresa Bellia Giuseppe
 Partita IVA: IT02103660847
 Codice fiscale: BLLGPP79R17A089R
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Corso Odierna, 168 - 92020 - Palma di Montechiaro (AG) IT
 Recapiti:
 Telefono: .3381782415
 E-mail: giuseppebellia79@yahoo.it

Cessionario/committente: Comune di Palma di Montechiaro -
 4 Settore - Ufficio Tecnico Comunale
 Codice Fiscale: 81000070847
 Sede: Via Fiorentino 89 - 92020 - Palma di Montechiaro (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

FATTURA NR. FATTPA 1_15 DEL 25/06/2015

Importo totale documento: 9.450,38 (EUR)

Importo da pagare entro il 25/07/2015: 7.746,21 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 02	LAVORO DI MANUTENZIONE IDRICA	1.00	NR	7.746,21	7.746,21	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	7.746,21	1.704,17	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	7.746,21	25/07/2015	SANT'ANGELO	IT02W0577283030C C0080080302	BB30G

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015 (versione 1.0.12)

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL
10/04/2015
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	36061955	del	22/06/2015
Riferimento	41	del	31/03/0015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20152027252686		

Spett.le BELLIA GIUSEPPE
m.zimmile@consulentidellavoropec.it

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO
TECNICO
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Impresa	BELLIA GIUSEPPE				
Sede legale	CORSO ODIERNA 168 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Sede operativa/Ind attività	CORSO ODIERNA 168 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)				
Codice Fiscale	BLLGPP79R17A089R	e-mail	zimmile@tin.it	e-mail PEC	m.zimmile@consulentidellavoropec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.176 DEL DPR 207/2010 PER LA SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA I VIA PIRANDELLO INCROCIO VIA ITALIA E IN VIA TURATI INCROCIO SALITA COLLEGIO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 13662518
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 07/07/2015	
Il responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA	
☒ I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 0105046363
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/06/2015	
Il responsabile del procedimento IACONO QUARANTINO ANGELINO	
☒ CASSA EDILE - C.E. DI AGRIGENTO - AG	☒ È iscritta con C.I. n° 009475
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/04/2015	
Cantiere: VIA FIORENTINO 89, 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)	
Il responsabile del procedimento TARALLO RAFFAELE	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 08/07/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

COSTANZA LUIGI



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Certificazione (*art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012*)

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta-*

Il Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile
